

令和7年度 常盤松中学校 校舎増築工事等について

令和7年3月17日
流山市教育委員会 学校施設課 施設整備係
TEL04-7157-2755

令和8年4月から常盤松中学校増築校舎の供用開始に向けて、令和7年度に校舎増築工事を行います。工事の主な内容は、増築校舎・渡り廊下新設、既存校舎接続部分の改修・昇降口下足箱更新、体育館スロープ新設等です。現段階での工事予定は下記のとおりです。

【工事予定】

項目	令和7年	5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		令和8年	2月		3月		内容		
	4月	1	10	20	1	10	20	1	10	20	1	10	20	1	10	20	1	10	20	1	10	20			
(1) 増築校舎・渡り廊下新設		増築校舎・渡り廊下新設																		備品等設置	生徒増に伴う教室を確保するために、普通教室10教室を有した増築校舎(2階建)を新設します。また、既存校舎と接続するために渡り廊下を新設します。				
(2) 既存校舎接続部分の改修(廊下新設)・昇降口下足箱の更新					増築校舎との接続部分の改修(廊下新設)																			増築校舎と既存校舎が行き来できるように一部教室を半分にし、廊下を新設します。また、昇降口下足箱を更新します。工事の大半は夏休み中に施工しますが、一部の工事で夏休み前後に行います。	
(3) 体育館スロープ・体育館脇水場新設			体育館脇水場新設			体育館スロープ新設																			体育館玄関付近にスロープを新設します。また、体育館外側のグラウンドに面している箇所に水場を新設します。工事期間中でも、授業や部活動などの利用は可能です。
(4) その他		外部配管工事				職員室改修																		テニスコート整備等	夏休み期間に職員室を広げる工事を行います。2月頃より工事エリア内のグラウンド整備・復旧を行います。校舎増築に伴い形状が変わるため、今後、学校と協議して、コースロープや必要な備品を設置する予定です。



【安全対策について】

工事の際は仮囲い・コーンを設置するなど、生徒との動線を分けることで安全を確保します。そのため、来年度はグラウンド側の南門は終日工事車両の専用門とし、生徒の出入りは使用不可とさせていただきます。また、学校運営しながらの工事となるため、騒音や振動は最小限に留めていきます。長期間に及び様々な面で御迷惑をおかけしますが、安全対策には細心の注意を払いますので御協力のほどよろしくお願いします。

体育館正面スロープ新設
R7.7/20~R7.10/31

体育館側倉庫廻り改修
R7.7/20~R7.10/31

増築校舎・渡り廊下新設
R7.5/1~R8.3/15

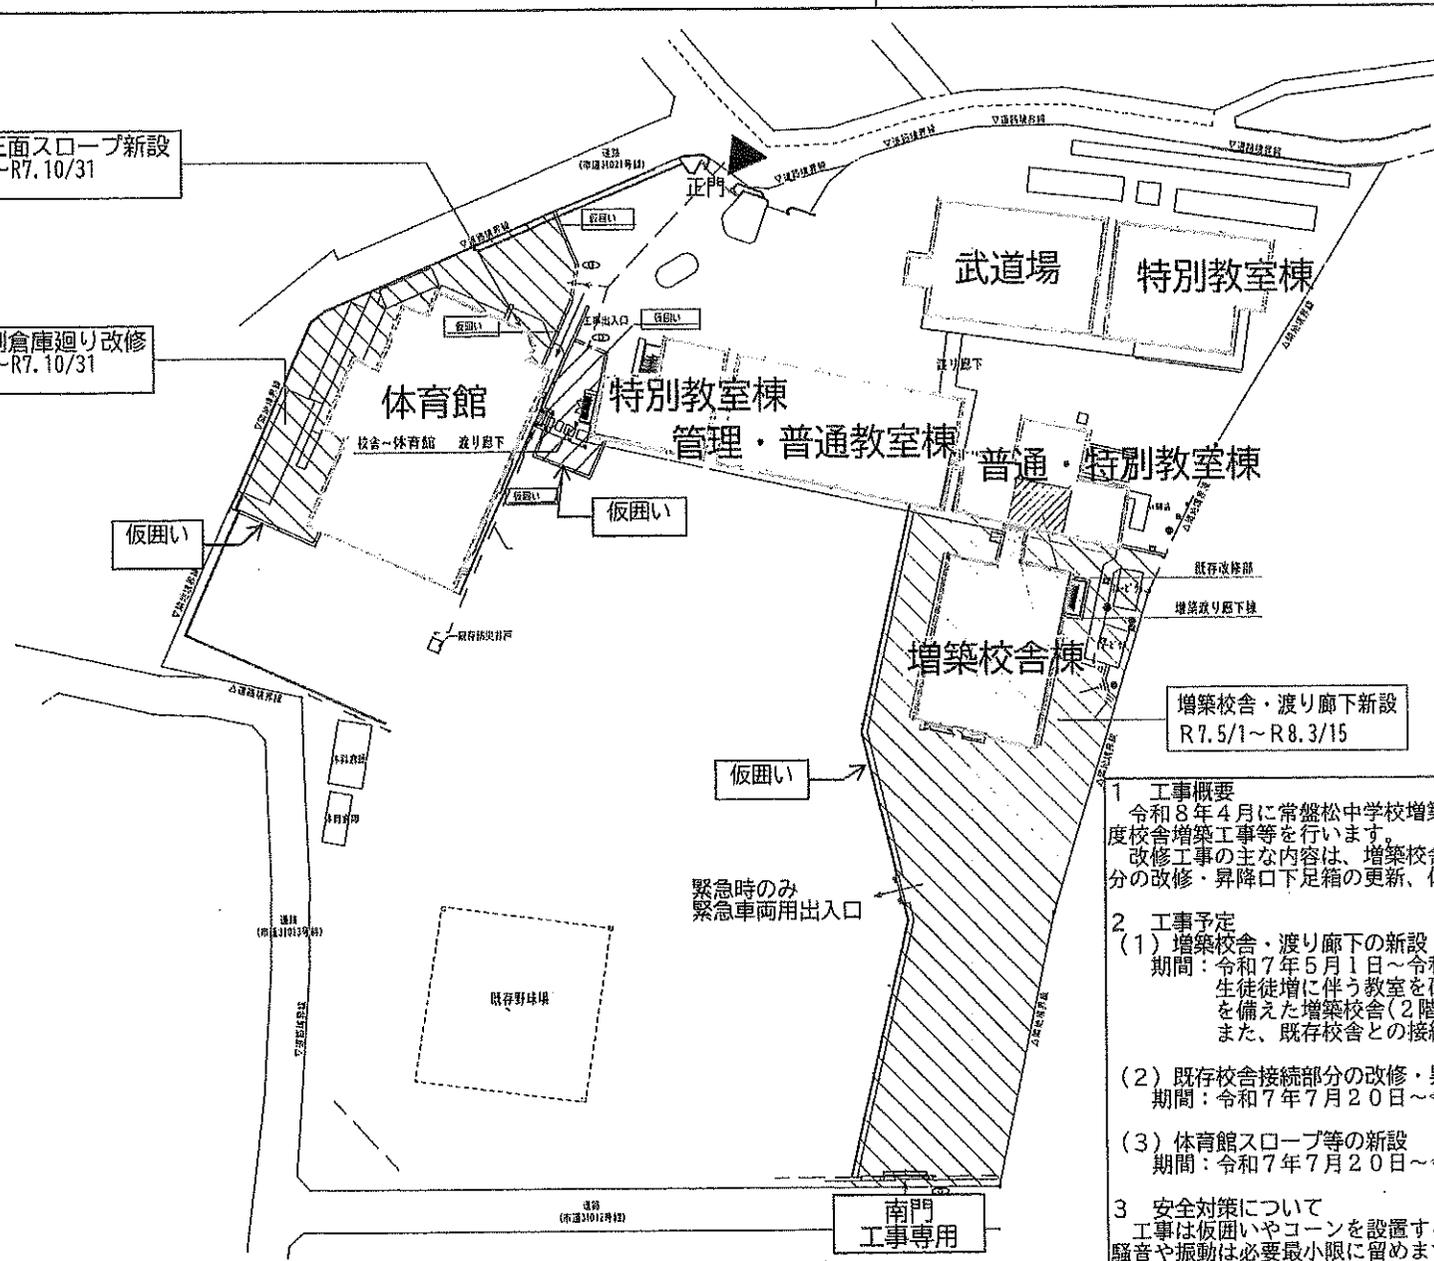

- 1 工事概要
令和8年4月に常盤松中学校増築校舎の共用開始に向けて、令和7年度校舎増築工事等を行います。
改修工事の主な内容は、増築校舎・渡り廊下の新設、既存校舎接続部分の改修・昇降口下足箱の更新、体育館スロープ新設等です。
- 2 工事予定
 - (1) 増築校舎・渡り廊下の新設
期間：令和7年5月1日～令和8年3月15日
生徒徒増に伴う教室を確保するために、普通教室10教室を備えた増築校舎(2階)を新設。
また、既存校舎との接続するために渡り廊下を新設
 - (2) 既存校舎接続部分の改修・昇降口下足箱の更新
期間：令和7年7月20日～令和7年10月31日
 - (3) 体育館スロープ等の新設
期間：令和7年7月20日～令和7年10月31日
- 3 安全対策について
工事は仮囲いやコーンを設置するなど、生徒との動線を分け、騒音や振動は必要最小限に留めます。
グラウンド側の南門の生徒出入りは終日使用不可とします。

常盤松中学校 令和7年度工事計画図

工期は、現時点の想定です。工事請負者との協議で変更することがあります。
